

SIIRT ÜNİVERSİTESİ

**2012 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

MART 2013

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı





İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	3
II – GENEL DEĞERLENDİRME	4
2.1- Misyon.....	4
2.2- Vizyon.....	4
2.3- Finansman Kaynakları.....	4
2.4- Temel Amaç ve Hedefler.....	6
2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi.....	7
2.6- 2012 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler.....	9
2.7- 2012 Yılı Yatırım Hedefleri.....	11
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	11
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	12
III- 2012 YILI YATIRIM PROGRAMLARI	13
IV- ÖNERİLER	19
VI - Ekler	
...Siirt Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi.....	20
...Siirt Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	21
...Siirt Üniversitesi Yerleşkesi Vaziyet Planı.....	22

I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Uygulamaya giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, kamu mali yönetiminde çeşitli raporların hazırlanması ve idarelere ait harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması sağlanacaktır.

Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının

belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle mümkündür. 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

2012 yılı, Üniversitemizin yatırım bütçesi ve uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yatırım programı kapsamındaki projeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 2012 yılı yatırım programları hazırlanmış ve bu program çerçevesinde gerekli ihaleler düzenlenmiştir. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak ileriye yönelik sürdürülen altyapı faaliyetleri 2012 yılında da devam etmiştir. Büyük onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Birimlerin makine, teçhizat, bilgi teknolojileri ve taşıt ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2012 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Murat ERMAN
Rektör



II – GENEL DEĞERLENDİRME

2.1- Misyon

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.

2.2- Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmak.

2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, kafeterya vs.) Gelirleri
 - 3) Öğrenci Harçları
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 5) Örgün Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Hibe
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlar

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, **2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, 46'ıncı maddesi cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesi, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,**



2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, **2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi** uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, **Ek 26'ncı maddesi** uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, **Ek 27'nci maddesi** ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, **2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.**

Üniversitemizin 2012 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplam 20.156.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 13.926.900,00 TL ekleme yapılarak 2012 yılı toplam ödeneği 34.082.900,00 TL olmuştur. 2012 yılında bu ödeneğin 20.651.681,22 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz 2012 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO. KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	ORAN
06.1	Mamul Mal Alımları	3.836.000,00	726.900	60.000,00	4.502.900,00	4.285.476,22	95,17
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	70.000,00	60.000		130.000,00	129.917,01	99,94
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.700.000,00	13.200.000,00		28.900.000,00	16.103.253,15	55,72
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00			500.000,00	83.034,84	16,61
06.9	Diğer Giderler-BAP	50.000,00			50.000,00	50.000,00	100,00
GENEL TOPLAM		20.156.000,00	13.986.900,00	60.000,00	34.082.900,00	20.651.681,22	60,59



2.4-Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç-1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Amaç-2 EĞİTİMİN ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi
	HEDEF 2.2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi
	HEDEF 2.3. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması
	HEDEF 2.4. Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi
	HEDEF 2.5. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
	HEDEF 2.6. Üniversite ile sanayi işbirliğini ileriye taşıyarak bölge sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması
Amaç-3 İNSAN KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi
Amaç-4 BİLİMSEL FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN ARTIRILMASI	HEDEF 4. 1. Üniversitenin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması
	HEDEF 4.2. Yayınların artırılması
	HEDEF 4.3. Araştırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması.
Amaç-5 FINANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5. 1. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin artırılması
	HEDEF 5. 2. Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması



2.5- Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72'nci maddesiyle kurulmuştur. Kurulduğu 2007 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim verme çabasını devam ettirmektedir. Siirt Üniversitesi, 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak kurulmuş ve 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu adı altında ön lisans programları düzeyinde eğitime devam etmiştir. 1989-1990 öğretim yılında bünyesinde lisans programları açılan Yüksekokul 1992 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almıştır. Bugüne kadar Üniversitemizden Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Sağlık programlarından çok sayıda başarılı öğrenci mezun olmuştur.

2012 yıl sonu itibariyle Üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere altı fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere iki enstitü, Siirt Meslek Yüksekokulu, Erüh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 Meslek Yüksekokulu ile bir adet Sağlık Yüksekokulu bulunmaktadır.

Üniversitemizin şehir merkezi kampusu toplam kapalı alanı; 33.744 m²'dir. 2012 yılı itibariyle burada, Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Lojmanlar bulunmaktadır. Yeni kampus alanında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı binaları tamamlanmış olup, 2013 yılı şubat ayından itibaren hizmete girmiştir. 2013 yılından itibaren Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri Kezer kampusunda eğitime devam edeceklerdir. Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Tesisler, Kapalı Spor Salonu ile altyapıya ait yapım inşaatları devam etmektedir.

Üniversitemize ait Yerleşkelerin Taşınmazlar İtibariyle Dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine/Diğer	
Merkez Kampus Alanı		32.064,22	32.064,22
Pınarca Köyü Kampus Alanı	657.919,11	1.568.221,72	2.226.140,83
Erüh Meslek Yüksekokulu		45.903,53	45.903,53
Kurtalan Meslek Yüksekokulu		4.816,00	4.816,00
Sağlık Yüksekokulu		9.040,00	9.040,00
Toplam	657.919,11	1.660.045,47	2.317.964,58



Üniversitemiz 2012 Yılı Personel Durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL	SAYISI
Profesör(4'ü görevlendirme)	5
Doçent	3
Yrd.Doç. Dr.	45
Öğretim Görevlisi	56
Okutman	15
Araştırma Görevlisi	70
Uzman	1
TOPLAM	195

İDARİ PERSONEL	SAYISI
Genel İdari Hizmetleri Sınıfı	153
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3
Teknik Hizmetler Sınıfı	28
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	9
TOPLAM	194



2.6- 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler

Üniversitemiz 2012 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş, spor sektöründe bir ve teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere yedi adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Hedeflerimiz doğrultusunda 2012 yılı bütçesi ile Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri harcamaları aşağıda gösterilmiştir.

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından

- 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Kezer Kampusundaki plan değişikliği nedeni ile Vaziyet Planı Projesi Revizyonu işi yaptırılmıştır.
- 2 Kampus Alt Yapısı Projesi kapsamında kampus alanı alt yapı 1.etap inşaatında programlanan yapım işleri tamamlanmıştır.
- 3 Kezer Kampusu ana kapı giriş düzenleme işi tamamlanmıştır.
- 4 2010 yılında yapımına başlanılan Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında 3 blok ve ısı merkezinden oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
- 5 2011 yılında ihalesi yapılan Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.
- 6 24.01.2011 tarihinde inşaatına başlanan 2 Bloktan müteşekkil Sosyal Tesis İnşaatının, kaba inşaatı tamamlanmıştır.
- 7 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında 1000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşaatı yapım işi kaba inşaatı tamamlanmıştır.
- 8 2010 yılında yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
- 9 Büyük Onarım projesi kapsamında planlanan Eğitim Fakültesi, Eruh MYO ile Sağlık Yüksekokulunda çeşitli bakım, onarım işleri tamamlanmıştır.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

1. Personel Daire Başkanlığındaki personel özlük bilgi sistemi yazılımı güncelleştirilmiştir.
2. Mühendislik-Mimarlık Fakültesine Akademik Research Programı alımı yapılmıştır.
3. Mühendislik-Mimarlık Fakültesine Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Alınmıştır.
4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 150 kullanıcı Win7 yazılımı alınmıştır.
5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 paket bilgi işlem sistem odaları yazılımı alınmıştır.



c) Teknik Donanım, Tefrişat ve Araçlar Bakımından,

1. Sağlık MYO için 1 sistem eğitim kiti alımı yapılmıştır.
2. 237 sayılı Taşıt Kanununa göre 2012 yılı bütçesinden bir adet büyük otobüs alınmıştır.
3. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemeler satın alınmıştır.
4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet oto yıkama makinesi alınmıştır.
5. Kurtalan MYO için 1 adet telefon santralı alınmıştır.
6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet şasi üst yapısı alınmıştır.
7. Mühendislik Mimarlık Fakültesi için 2.236,39 m perde sistemleri alınmıştır.
8. Mühendislik Mimarlık Fakültesi için 742 parça okul mefruşatı alınmıştır.
9. Mühendislik Mimarlık Fakültesi konferans salonu 248 koltuk alınmıştır.
10. İMİD Başkanlığı tarafından Güvenlik Kamera Sistemi alınmıştır
11. Rektörlük makamı için 30 m2 halı alınmıştır.



Alımı Yapılan Eğitim-Öğretim İhtiyaçları Tablosu	
Adı	Sayısı
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	120
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	4
GÜÇ KAYNAĞI	4
DÖNERLİ TABURE	150
PLASTİK MASA VE SANDALYE	235
OKUL MEFRUŞATI	107
MASA	15
MİKROSKOP	5
DOLAP	15

Bu kapsamda ayrıca yatırım bütçesinin muhtelif işler projesi ödeneğinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere işyeri makine teçhizat alımları yapılmıştır.

d) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

Öğrencilere yönelik yerli ders kitabı alımı kapsamında 3.052 adet kitap alınarak kütüphane kaynakları geliştirilmiştir.



Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe Uygulama Sonuçları							
Ekonomik Kod		Açıklama			Tutarı	Proje Numarası	
830	6			Sermaye Giderleri	20.651.681,22		
830	6	1		Mamul Mal Alımları	4.285.476,22		
830	6	1	1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.135.234,09		
830	6	1	1	1	Büro ve Mefruşatı Alımları	590.992,34	2012H032800
830	6	1	1	2	İşyeri Mefruşatı Alımları	72.095,82	2012H032800
830	6	1	1	3	Okul Mefruşat Alımları	472.145,93	2012H032800
830	6	1	2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.664.314,40		
830	6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	189.519,20	2012H032800
830	6	1	2	4	Laboratuvar Cihaz Alımları	28.598,00	2012H032800
830	6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	165.624,80	2012H032800
830	6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.280.572,40	2012H032800
830	6	1	4	Taşıtlar Alımları	432.575,73		
830	6	1	4	1	Kara Taşıtları Alımları	432.575,73	2012H032800
830	6	1	6	Yayın Alımları Ve Yapımları	53.352,00		
830	6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	53.352,00	2012H032800
830	6	3		Gayri Maddi Hak Alımları	129.917,01		
830	6	3	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	129.917,01		
830	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	129.917,01	2012H032800
830	6	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.103.253,15		
830	6	5	1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	131.072,03		
830	6	5	1	1	Proje Giderleri	32.417,10	2012H032790
830	6	5	1	90	Diğer Giderler	98.654,93	2010K121370
830	6	5	7	Müteahhitlik Giderleri	15.972.181,12		
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	10.016.944,62	2009H032270
830	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	2.554.524,84	2009H032280
830	6	5	7	90	Diğerleri	3.400.711,66	2009H032260
830	6	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	83.034,84		
830	6	7	7	Müteahhitlik Giderleri	83.034,84		
830	6	7	7	1	Hizmet Binası	75.611,92	2012H032800
830	6	7	7	90	Diğerleri	7.422,92	2012H032800
830	6	9		Diğer Sermaye Giderleri	50.000,00		
830	6	9	9	Diğer Sermaye Giderleri	50.000,00		
830	6	9	9	1	Diğer Sermaye Giderleri	50.000,00	2010K121370



2.7- 2012 Yılı Yatırım Hedefleri

2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2012 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. 2012 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Kalkınma Bakanlığından alt yapı projesi için Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden gönderilen 2.500.000,00 TL ile birlikte diğer Eğitim ve Spor sektörü projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 maddesi uyarınca likit karşılığı eklenen 11.426.000,00 TL dahil toplam 13.986.900,00 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. BAP kapsamındaki ödenekler tahakkuka bağlanarak özel hesaba gönderildiğinden tamamı harcama sütununda gösterilmiştir.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı(%)
Eğitim	5	63.308.000,00	17.000.000,00	13.286.000	60.000	30.226.000,00	17.427.600,29	57,66
Spor	1	3.245.000,00	1.300.000,00	700.000,00		2.000.000,00	1.368.080,93	68,40
Araştırma-BAP	1	4.280.000,00	1.856.000,00			1.856.000,00	1.856.000,00-	

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

* Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

* Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin KPSS ile işe başlayan genç ve tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ve mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.

* Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması ve Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir

* Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması.



III- ÜNİVERSİTEMİZ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI

3.1- 2012H032790 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim
Proje No	2012H032790
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Bedeli	100.000,00 TL
Eklenen Ödenek	300.000,00 TL
Yılı Ödeneği	400.000,00 TL
Harcama	32.417,10 TL
Kalan Ödenek	68.140,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%8,10
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%8,10
AÇIKLAMALAR: Üniversitemiz kezer yerleşkesine ait vaziyet planı revizyonu işi yaptırılmıştır. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.	





3.2- 2012H032800 Muhtelif İşler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2011H036160	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Tek.D.Bşk., İMİD D. Bşk., Kütüphane ve Dök. D. Bşk.	
Proje Bedeli	2.600.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	726.900,00 TL	
Yılı Ödeneği	3.326.900,00 TL	
Harcama	2.692.428,07	
Kalan Ödenek	634.471,93	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	% 80,93	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	% 80,93	
İşin Adı	Proje Adedi	2012 Harcama Tutarı
Büyük Onarım	1	83.034,84 TL
Makina, Teçhizat Alımı	1	2.019.624,22 TL
Kütüphane Yayın Alımı	1	53.352,00 TL
Bilgi Teknolojileri	1	129.917,01 TL
Taşıt Alımı	1	406.500,00 TL
AÇIKLAMALAR:		
<ul style="list-style-type: none">Eğitim Fakültesi, Eruh MYO ve Sağlık Yüksekokulunda bakım onarım yapılmıştır.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizde kullanılmak üzere.150 kullanıcı Win7 lisans yazılımı ve bilgi işlem altyapısının yapılandırılması kapsamında sistem odaları alınmıştır.Kütüphane kaynaklarını artırmak üzere 3.052 adet kitap alımı yapılmıştır.Personel özlük programı otomasyonu yıllık ücret bedeli ödenerek, İMİD Başkanlığı tarafından bütçe kapsamında bir adet taşıt alınmıştır.İMİD Başkanlığı tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere makine, teçhizat, eğitim donanımı ile büro mobilyaları alınmıştır.2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



3.3- 2009H032260 Kampus Alt Yapısı (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032260	
Projenin Adı	Kampus Alt Yapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	17.703.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	6.857.689,30 TL	
2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	4.000.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	5.900.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	9.900.000,00 TL	
Yılı Harcama	4.407.162,28 TL	
Kalan Ödenek	5.492.837,72 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%44,52	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%63,63	
İşin Adı	Adedi	2012 Harcama Tutarı
Kampus Alt Yapısı 1. Etap İnşaatı Yapım İş	1	4.180.251,58 TL
Kezer Kampusu Giriş Kapısı Düzenleme Çalışması	1	226.910,70 TL
Açıklamalar: Bu proje kapsamında, 10.01.2011 tarihinde 7.485.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanan kampus altyapısı 1. etap inşaatı yapım işi bitmiş olup, geçici kabul aşamasındadır. Aynı proje kapsamında olan ana giriş kapısı düzenleme işinin %51'i tamamlanmış olup, imalatlar devam etmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenen 2.500.000,00 TL ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca 3.400.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



3.4- 2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032270	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	30.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	16.237.154,48 TL	
2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	7.800.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	5.300.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	13.100.000,00 TL	
2012 Harcama	9.109.148,93 TL	
Kalan Ödenek	3.990.851,07 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%69,54	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%84,49	
İşin Adı	Adedi	2012 Harcama Tutarı
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı Yapım İşİ	1	3.334.082,67 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İşİ	1	5.775.066,26 TL
AÇIKLAMALAR:		
<p>2010 yılında 13.499.472,93 TL bedel ile ihale edilen 3 Blok + Isı merkezinden oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı yapım işi tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.</p>		
<p>Yine bu proje kapsamında bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi yapım işi 10.745.000,00 TL bedel ile ihale edilerek, 15.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. B blok betonarme imalatları bitmiş olup, A blok betonarme imalatlarına devam edilmektedir.</p>		
<p>2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir</p>		





3.5- 2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032280	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	12.908.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	2.947.732,87 TL	
2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	2.500.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	1.000.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	3.500.000,00 TL	
2012 Harcama	1.186.443,91 TL	
Kalan Ödenek	2.313.556,09 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%33,90	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%32,03	
İşin Adı	Adedi	2012 Harcama Tutarı
Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşİ	1	1.186.443,91
AÇIKLAMALAR:		
<p>24.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 2 Bloktan müteşekkil Sosyal Tesis İnşaatının kaba betonarmesi ve dış duvar yapım imalatları tamamlandıktan sonra, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilmiştir. Tekrar çıkılan 2.009,000,00 TL bedel üzerinden ihale edilen iş için 05.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaatın kapı imalatları devam etmekte olup, çevre düzenleme işleri hazırlık aşamasındadır.</p> <p>2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir</p>		





3.6- 2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörün Adı	Spor	
Proje No	2010H050220	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	3.245.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	837.226,35 TL	
2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	1.300.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	700.00,00 TL	
Yılı Ödeneği	2.000.000,00 TL	
2012 Yılı Harcama	1.368.080,93 TL	
Kalan Ödenek	631.919,07 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%68,40	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%67,96	
İşin Adı	Adedi	2012 Harcama Tutarı
1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşİ	1	1.368.080,93 TL
AÇIKLAMALAR: <p>Bu proje kapsamında 21.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşinin betonarmesi tamamlanıp, duvar imalatlarına devam edilirken, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşme feshedilmiştir.</p> <p>23.08.2012 tarihli sözleşme ile 1.820.000,00 TL bedel üzerinden iş tekrar ihale edilerek 31.12.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bu işe ait ince imalatlar devam etmektedir.</p> <p>2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.</p>		



3.7- 2010K121370 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektörün Adı	DKH-Teknolojik Araştırma	
Proje No	2010K121370	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Özel Kalem	
Proje Bedeli	4.280.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması Cihaz Alımı	1.397.000,00 TL	
2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	1.856.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek		
Yılı Ödeneği	1.856.000,00 TL	
2012 Bütçesinden Yapılan Harcama	1.495.605,63 TL	
Kalan Ödenek	360.394,37 TL	
Bütçe Dışı Kaynaklardan Yapılan Harcama	512.915,60 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%80,58	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%79,57	
İşin Adı	Adedi	2012 Harcama Tutarı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Hazine Bütçesi	1	1.495.605,63 TL
Bütçe Dışı		512.915,60 TL
Açıklamalar: 2.000 m2 Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı ihalesi 16/12/2011 tarihinde yapılmış olup, 25.02.2012 tarihinde 1.684.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve 03/02/2012 tarihinde ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır. Bu iş kapsamında imalatlar bitmiş olup, geçici kabulü yapılmıştır. Sözleşme bedeli olan 1.684.000,00 TL'nin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 1.500.000,00 TL'yi aşan kısmı (+KDV) bütçe dışı kaynaklardan ödenerek projenin bina inşaatı %100 tamamlanmıştır. Daha önceki yıllar harcaması olan 1.397.000,00 TL ile birlikte projede kalan ödenekler Laboratuvar cihaz alımı kapsamında değerlendirilecektir.		





IV- ÖNERİLER

Yeni kurulan bir Üniversite olarak hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşabilmek için ödeneklerimizin artırılması gerektiği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığınca Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin, İcmal Harcama Programı ile 12 aylık ödeneklerin 3 aylık dilimler halinde serbest bırakılması sebebiyle verimli kullanılamamaktadır. Özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımların yılı yatırım programında tek dilim halinde serbest bırakılması halinde projenin tüm yönleriyle uygulanmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması.



2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2012 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

ADI: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SEKTÖR EĞİTİM

2012 Nakdi

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2011 KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2012H032790	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	Özel	2012	Siirt		100.000,00			100.000,00	+	300.000,00			32.417,10	
		2012H032800	Muhtelif İşler (GAP)	Özel	2012	Siirt		2.600.000,00			2.600.000,00	+	726.900,00			2.692.428,07	
		2009H032260	Kampus Alt Yapısı (GAP)	Özel	2014	Siirt		17.703.000,00	6.857.689,30		4.000.000,00	+	5.900.000,00			4.407.162,28	
		2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)	Özel	2014	Siirt		30.000.000,00	16.237.154,48		7.800.000,00	+	5.300.000,00			9.109.148,93	
		2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	Özel	2013	Siirt		12.908.000,00	2.947.732,87		2.500.000,00	+	1.000.000,00			1.186.443,91	
TOPLAM								63.311.000,00	26.042.576,65		17.000.000,00		13.226.900,00			17.427.600,29	

SEKTÖR SPOR
ADI :

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2011 KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2010H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2012	Siirt		3.245.000,00	837.226,35		1.300.000,00	+	700.000,00			1.368.080,93	
TOPLAM								3.245.000,00	837.226,35		1.300.000,00		700.000,00			1.368.080,93	

SEKTÖR DKH
ADI :

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2011 KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2010K121370	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2013	Siirt		4.280.000,00	1.397.000,00		1.856.000,00	-	0			1.495.605,63	
TOPLAM								4.280.000,00	1.397.000,00		1.856.000,00		0			1.495.605,63	

GENEL TOPLAM								70.836.000	28.276.803,00		20.156.000,00	+	13.926.900,00			20.291.286,85
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	--	---------------	---	---------------	--	--	---------------



2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL

2012 Yılı Fiyatları ile Bin TL


Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		63.311.000,00			26.042.576,64			17.000.000			30.226.900,00			17.427.600,29
Spor	1		3.245.000,00			837.226,34			1.300.000			2.000.000,00			1.368.080,93
Diğer Kamu Hizmetler.	1		4.280.000,00			1.397.000,00			1.856.000			1.856.000			1.495.605,63
Sosyal	1		4.280.000,00			1.397.000,00			1.856.000			1.856.000			1.495.605,63
TOPLAM	7		70.836.000			28.276.802,98			20.156.000			34.081.900			20.291.286,85

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ VAZİYET PLANI



PERSPEKTİFLER

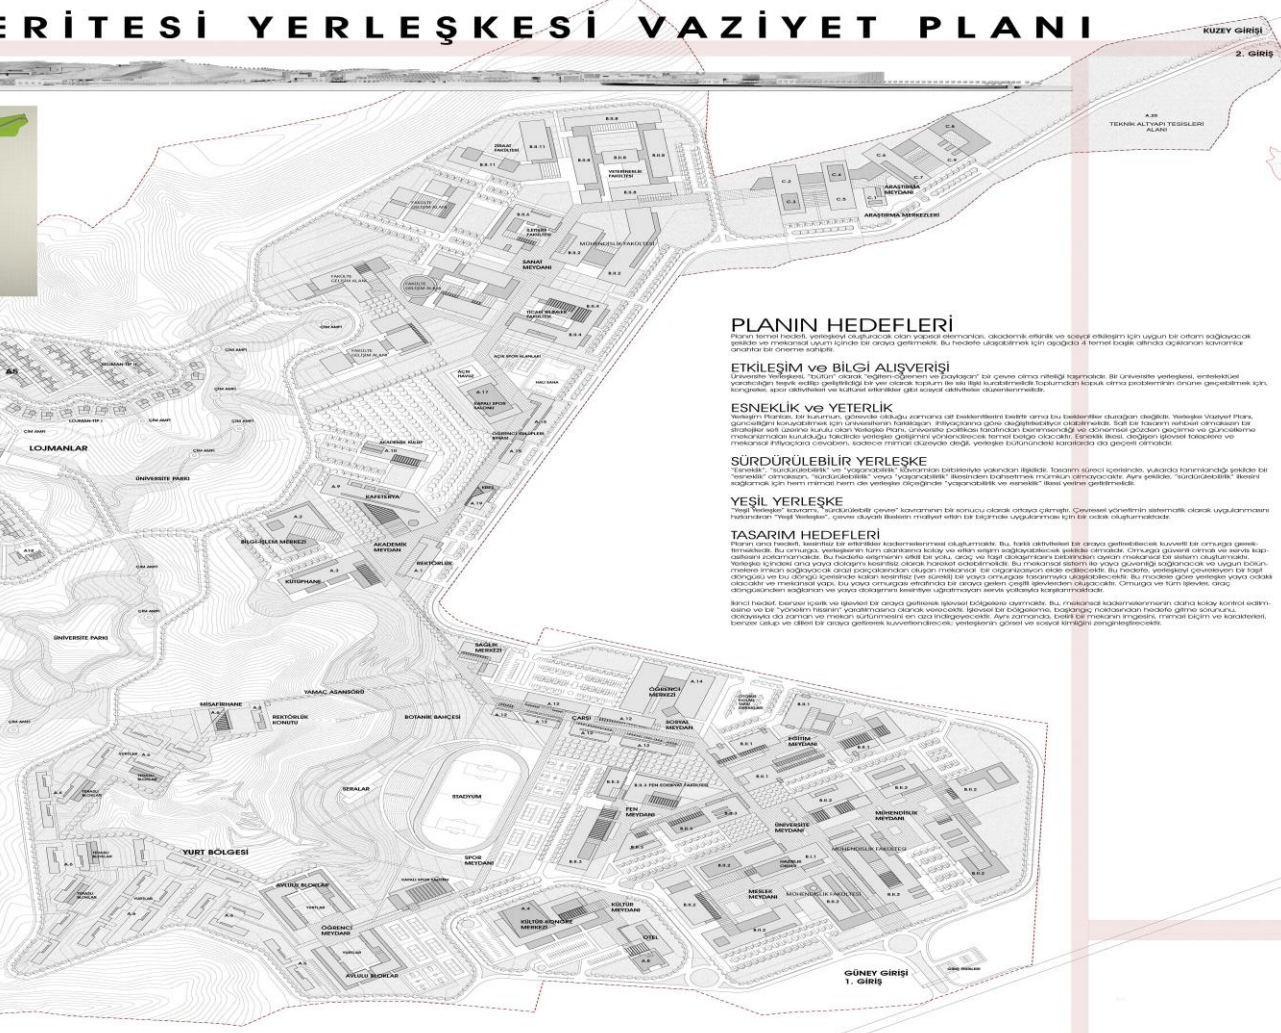

PLANIN HEDEFLERİ

Planın temel amacı, üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini, öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçları için uygun bir ortam oluşturmak, kaliteli ve modern yaşamı içinde barındırmasıdır. Bu hedefin ulaşılması için aşağıda temel hedefler özetlenmiştir. Üniversite yönetimi, emsalleri inceleyerek ve başarılı olanları örnek alarak, bu hedefleri gerçekleştirilebilir hale getirecektir.

ETKİLEŞİM VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileşime sokarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür. Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür.

ESNEKLİK VE YETERLİK

Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür. Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE

Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür. Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür.

YEŞİL YERLEŞKE

Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür. Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür.

TASARIM HEDEFLERİ

Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür. Üniversite yönetimi, bu alanın, genelinde olduğu gibi, üniversiteyi dışarıya açarak, üniversiteyi toplumla etkileştiren bir yapıya dönüştürmüştür.

GENEL ABAZİ KULLANIMI



YAYLA DOLAŞIMI



YAPILAR



YEŞİL ALANLAR



YURT BÖLGESİ



YOL ENERJİLERİ



SİİRT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ VAZİYET PLANI ÇİZİMLERİ

